



RESUMEN
OBRAS GEOTECNICAS DE REMEDIACION
JOB ID # 26 (KP 130+200)



Asentamiento diferencial sobre el ducto por saturación de suelos

Plan de Trabajo

Obras

Costos

Registro Fotográfico

F. Inicio 16-Mar

F. Término 25-Ago

% Avance 100%

HH totales 40,776

OBRAS EJECUTADAS - KP 130+200


Descripción de Actividad	Unit.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total
GAVIONES EN PIE DE ACOPIO LATERAL	m3		42	159	45			246
GAVIONES EN CANAL COLECTOR	m3				20	50	20	90
BARRERAS EN SACO SUELO CEMENTO	m3		13	71	132	100		316
FILTROS	ml		110	351	404	120	37	1022
CANALES	ml				296	84		380
CORTACORRIENTES	ml					294	305	599
REVESTIMIENTO CON MORTERO	m2					140	47	187
SIEMBRA	m2					4552	13847	18399

COSTOS DE GEOTECNIA - KP 130+200

DESCRIPCION	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	TOTAL	COSTO(\$)
COSTOS TECHINT							
COSTO MANO DE OBRA	48,667	69,969	57,634	73,681	4,940		254,890
Hrs. LABORADAS	7,324	11,572	9,286	12,594		40,776	
COSTO EQUIPOS	8,519	12,301	3,008	1,748	146		25,722
Hrs. OPERAT. EQUIPOS	548	874	334	366		2,122	
Hrs. STD BY EQUIPOS	432	242	266	68		1,008	
COSTO MATERIALES	21,511	16,063	18,448	11,897	0		67,919
COSTO SERVICIOS		3,555	659	914	43		5,170
COSTO TECHINT	78,696	101,888	79,749	88,240	5,128		353,701
HELICÓPTEROS							74,721
SUPERVISIÓN							
OTROS							5,000
TOTAL COSTO JOB KP 130+200						(US\$)	433,422

PLAN DE TRABAJO - JOB ID 26

ANTES

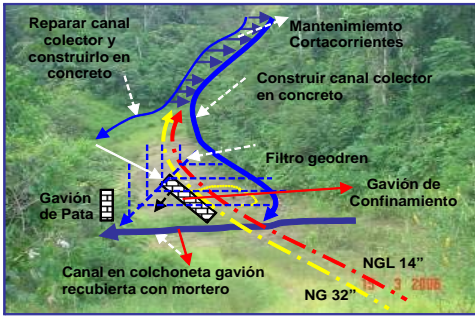

EN EJECUCIÓN



DESPUES

